


[illegible]

貯水槽清掃単価表(社団法人 新潟県貯水槽管理協会)

貯水槽の容量	受水槽(内、消費税)			高置水槽(内、消費税)		
	単位	税込単価	税抜単価	単位	税込単価	税抜単価
基本料金 10m ³ 以下	1基			1基		
10m ³ を超え 20m ³ 以下	m ³ 当り			m ³ 当り		
20m ³ を超え 35m ³ 以下	m ³ 当り			m ³ 当り		
35m ³ を超え 60m ³ 以下	m ³ 当り			m ³ 当り		
60m ³ を超え 100m ³ 以下	m ³ 当り			m ³ 当り		
100m ³ を超え 150m ³ 以下	m ³ 当り			m ³ 当り		
150m ³ 以上	m ³ 当り					

	施設名	槽数	水槽の 総量	10m ³ 以下	10m ³ を超 20m ³ 以下	20m ³ を超 35m ³ 以下	35m ³ を超 60m ³ 以下	60m ³ を超 100m ³ 以下	100m ³ を超 150m ³ 以下	150m ³ を超	合計
1	向鹿瀬水道 着水槽	1槽式	23m ³								
2	向鹿瀬水道 沈殿槽	1槽式	134m ³								
3	向鹿瀬水道 浄水池	2槽式	19m ³								
4	向鹿瀬水道 配水池	2槽式	198m ³								
5	角神水道 着水槽	1槽式	9m ³								
6	角神水道 沈殿槽	1槽式	89m ³								
7	角神水道 浄水池・ポンプ槽	2槽式	112m ³								
8	角神水道 配水池(旧)	2槽式	75m ³								
9	角神水道 配水池(新)	1槽式	180m ³								
10	日出谷水道 当麻着水槽	1槽式	3m ³								
11	日出谷水道 当麻浄水池	1槽式	44m ³								
12	日出谷水道 当麻配水池	2槽式	138m ³								
13	日出谷水道 水沢浄水池	1槽式	40m ³								
14	日出谷水道 水沢湧水配水池	2槽式	152m ³								
15	日出谷水道 水沢膜配水池	1槽式	110m ³								
16	平瀬水道 配水池	2槽式	46m ³								
17	平瀬水道 浄水槽	1槽式	2m ³								
18	平瀬水道 着水槽	1槽式	2m ³								
19	夏渡戸水道 湧水着水槽	1槽式	5m ³								
20	夏渡戸水道 浄水池	1槽式	2m ³								
21	夏渡戸水道 配水池	2槽式	40m ³								
22	実川島水道 着水沈殿槽	1槽式	26m ³								
23	実川島水道 浄水槽	1槽式	5m ³								
24	実川島水道 配水池	1槽式	15m ³								
25	菱潟水道 配水池	2槽式	44m ³								
26	豊実水道 浄水池	2槽式	30m ³								
27	豊実水道 高区配水池	1槽式	73m ³								
28	豊実水道 低区配水池	1槽式	60m ³								
29	荒沢水道 配水池	1槽式	42m ³								
30	徳石水道 配水池	2槽式	39m ³								
31	新渡水道 配水池	2槽式	43m ³								
32	深戸水道 配水池	2槽式	61m ³								
33	荒沢水道 着水槽	1槽式	2m ³								
34	日出谷水道 湧水着水槽	1槽式	5m ³								

施設位置図

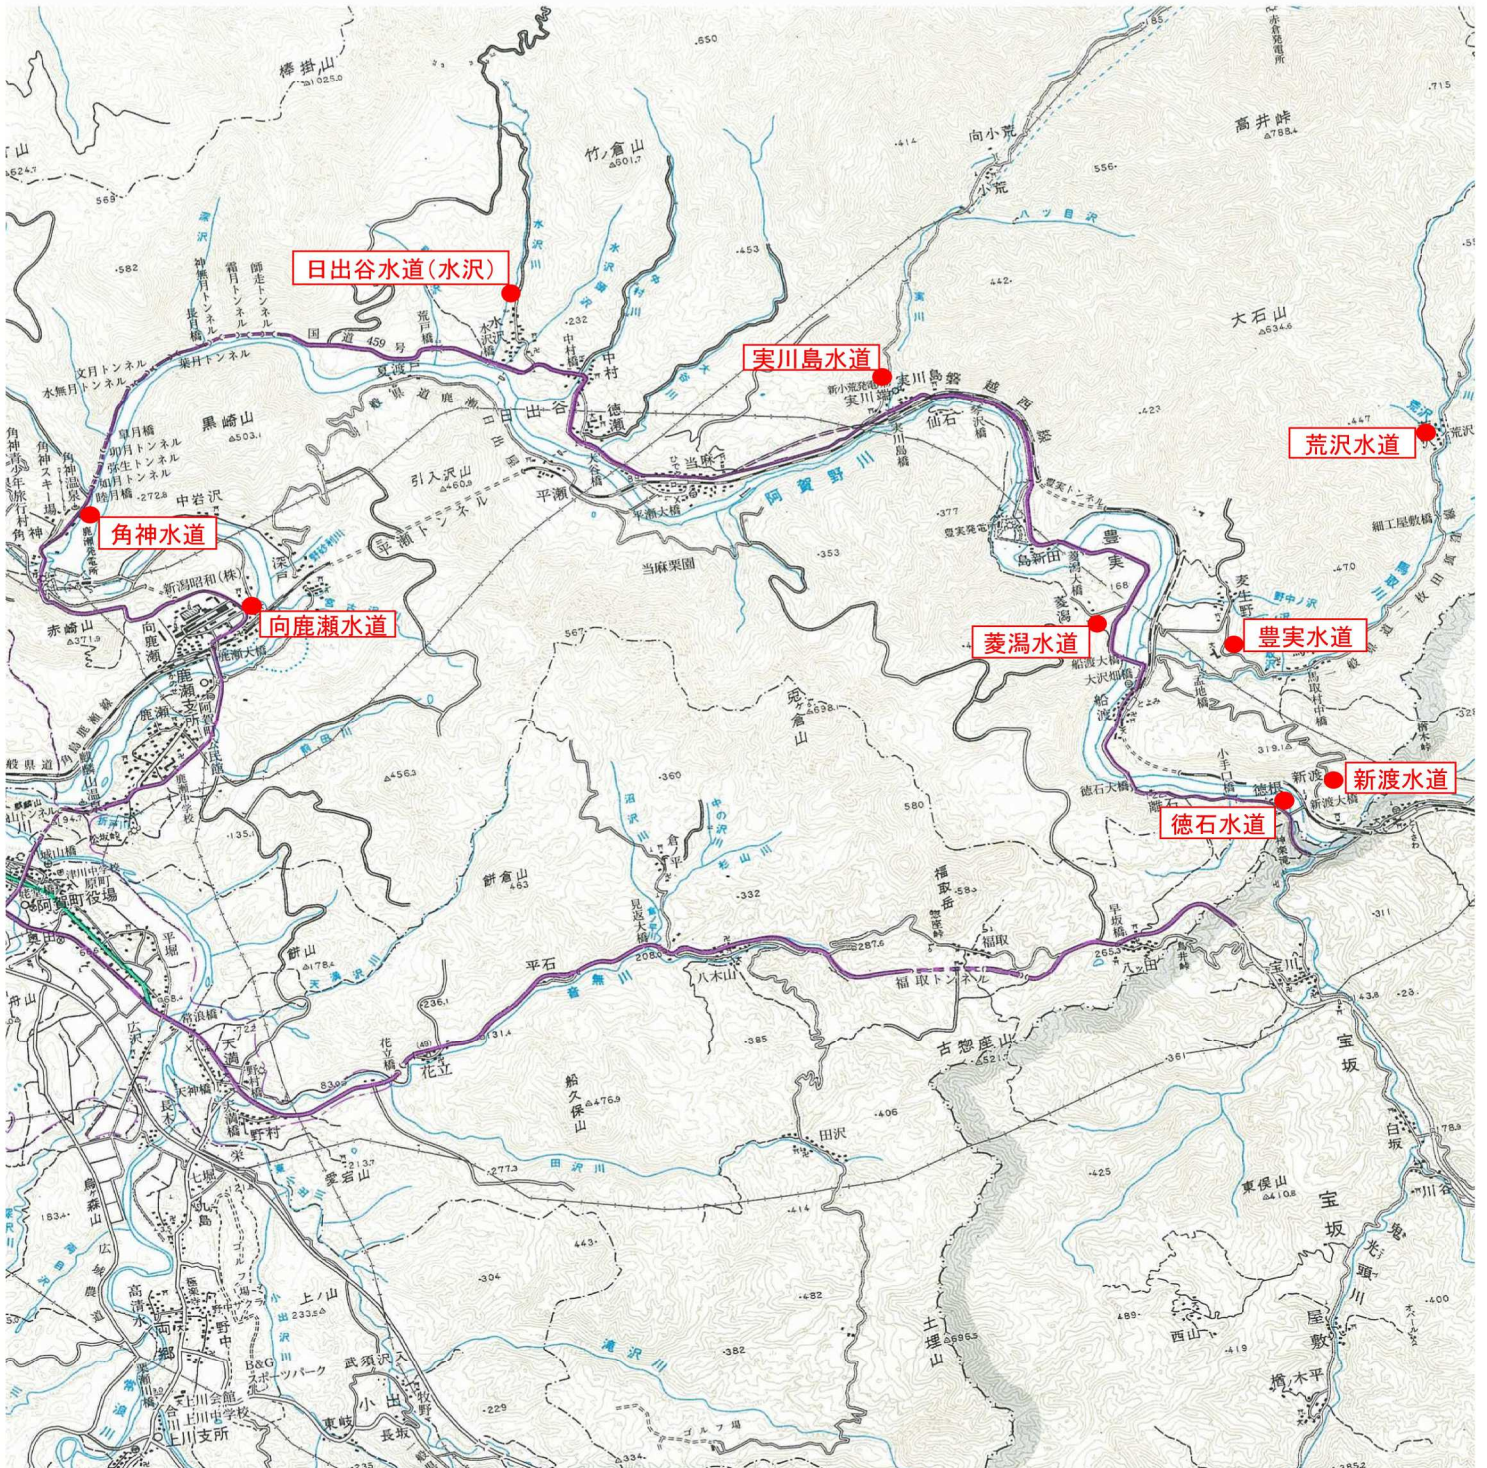

鹿瀬地域	年度	設計容量		H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	R2	R3	R4	R5	R6	R7	
水道施設	実施回数/実施目安	(実測に基づく)		槽数	回数	回数	回数	回数	回数	回数	回数	回数	回数	回数	回数	回数	回数	回数	回数	
向鹿瀬	着水槽	2 回/年	23 m3	1	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
	沈殿槽	2 回/年	134 m3	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
	浄水地	1 回/年	19 m3	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	配水池	1 回/年	198 m3	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	ろ過器	状況により		－	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	
角神	着水槽	2 回/年	9 m3	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	
	沈殿槽	2 回/年	89 m3	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
	浄水地・送水ポンプ槽	1 回/年	112 m3	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	配水池(旧)	1 回/年	75 m3	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	配水池(新)	1 回/年	180 m3	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	ろ過器	状況により		－	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	
日出谷 (当麻) (水沢)	当麻着水槽	1 回/年	3 m3	2	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
	当麻浄水地	1 回/年	44 m3	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	
	当麻配水池	1 回/年	138 m3	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	
	水沢浄水地	1 回/3-4年	40 m3		0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	
	水沢配水池(湧水)	1 回/年	152 m3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	水沢配水(膜)	1 回/2-3年	110 m3	2	0	0	1	0	0	1	1	1	0	0	1	0	0	1	0	
	湧水着水槽	状況により	5 m3		0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
深戸	配水池	1 回/2-3年	61 m3		0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0
夏渡戸	湧水着水槽	状況により	5 m3		0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	浄水地	1 回/2年	2 m3	1	0	1	0	1	0	1	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0
	配水池	1 回/2年	40 m3	2	0	1	0	1	0	1	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0
平瀬	着水槽	1 回/2年	2 m3	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0
	浄水槽	1 回/2年	2 m3	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0
	配水池	1 回/2年	46 m3	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0
実川島	着水・沈殿槽	1 回/年	26 m3	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	浄水槽	1 回/2年	5 m3	2	0	1	0	1	0	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1
	配水池	1 回/2年	15 m3	2	0	1	0	1	0	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1
菱潟	配水池	1 回/年	44 m3	2	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1
豊実	浄水地	1 回/2年	30 m3		0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0
	配水池(高区)	1 回/2年	73 m3		0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0
	配水池(低区)	1 回/2年	60 m3		0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1
荒沢	着水槽	1 回/2年	2 m3		0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
	浄水地	状況により	m3		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	配水池	1 回/2年	42 m3		0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0
徳石	配水池	1 回/年	39 m3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
新渡	配水池	1 回/年	43 m3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

鹿瀬地区配水池清掃業務委託特記仕様書

第1章 総則

本仕様書は水道配水池等の清掃及び清掃作業後の給水の適正を図るため、委託作業に関する事項を示すもので清掃の一般的事項は清掃作業及び清掃用機械器具の維持管理の方法等に係る基準（平成14年3月26日厚生労働省告示第117号）によること。

第2章 委託の内容

1. 目的

泥等混入物の除去による安全な水の供給を図るとともに配水池内部の状況確認による破損等の早期発見を目的とする。

2. 委託施設内容

設計書のとおり

第3章 作業前

1. 作業の実施日については、該当地区の飲食店・理美容店等の営業日を考慮し営業に支障がないよう監督員と協議のうえ決定すること。

2. 断水実施箇所における作業日の変更については、作業日の2日前（土・日祝日を含まない）までに監督職員に報告すること。

第4章 作業時

1. 配水池等の鍵は、原則として当日監督職員より受領し、作業終了後返還すること。

2. 配水池等の清掃時において緊急な修繕を要する破損等を発見した場合は監督職員の立会を求めるものとし、軽微な破損等については、写真等により報告すること。

第5章 作業終了後

①配水池の清掃後

配水管の末端等において給水等の復帰状況を確認し速やかに監督職員に報告すること。

②着水槽の清掃後

配水池等への流入を確認し速やかに監督職員に報告すること。

以上
